Groberminplan Ausführung
Kreisschule Mittelgösgen
Stand Vorprojekt
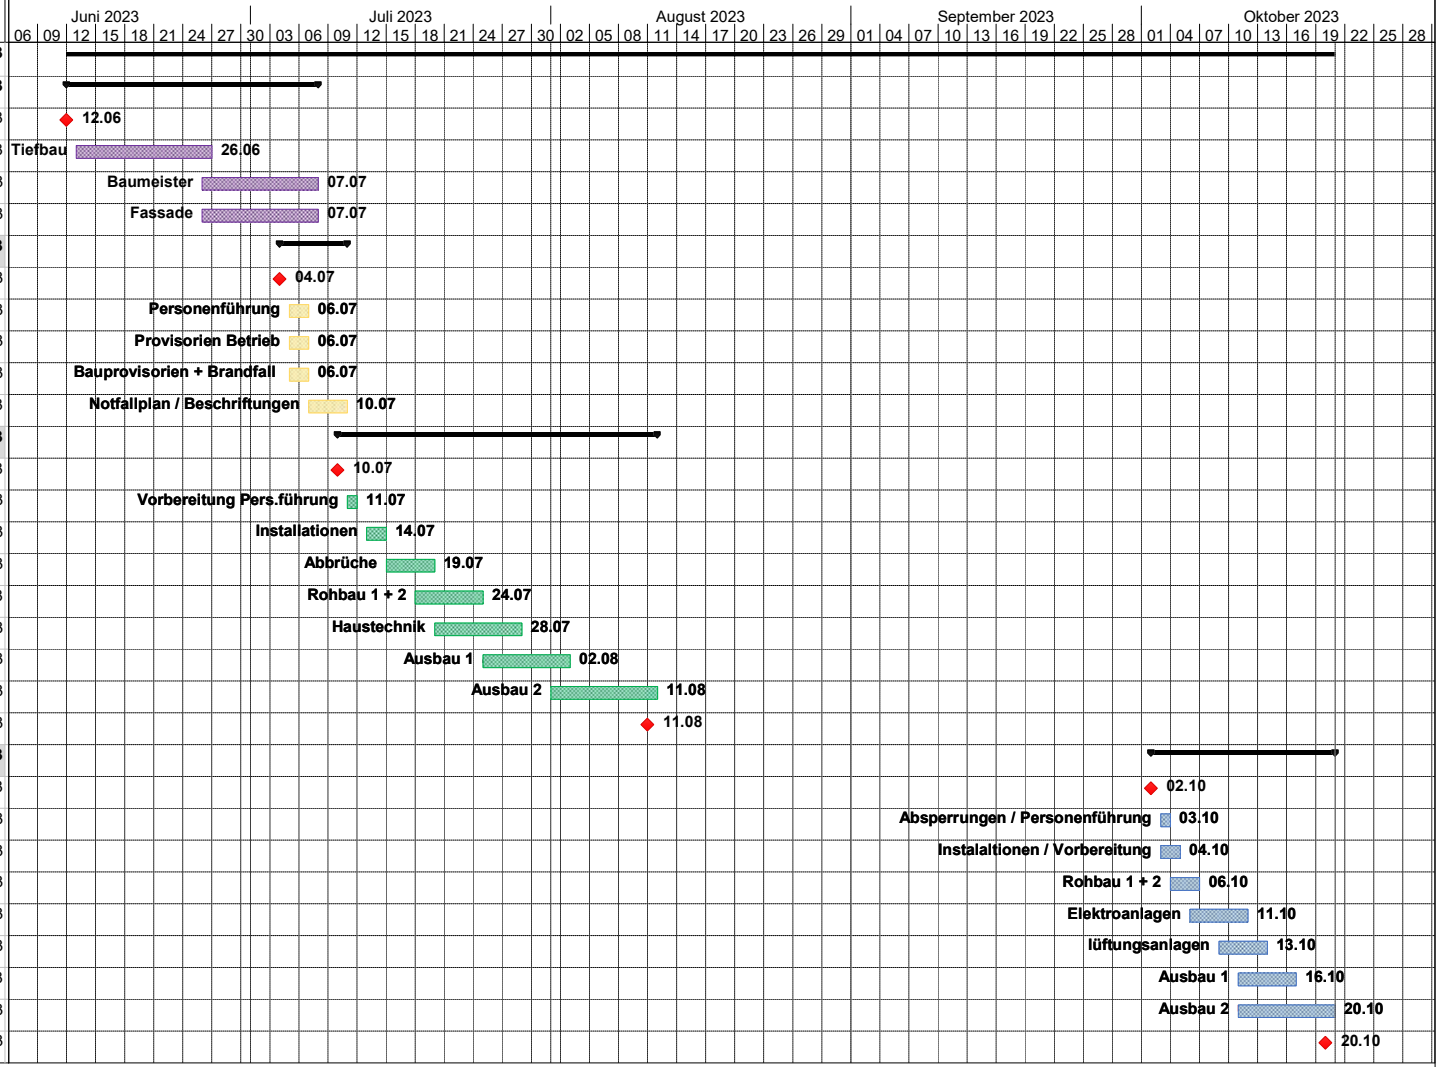
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0	**Kreisschule Mittelgösgen**	**95 Tage**	**Mon 12.06.23**	**Fre 20.10.23**
1	**Vorarbeiten Aussen (ev.)**	**20 Tage**	**Mon 12.06.23**	**Fre 07.07.23**
2	Start Aussenarbeiten	0 Tage	Mon 12.06.23	Mon 12.06.23
3	Tiefbau	10 Tage	Die 13.06.23	Mon 26.06.23
4	Baumeister	10 Tage	Mon 26.06.23	Fre 07.07.23
5	Fassade	10 Tage	Mon 26.06.23	Fre 07.07.23
6	**Vorbereitung Bau 1 Wo vorher**	**5 Tage**	**Die 04.07.23**	**Mon 10.07.23**
7	Sicherungsvorbereitung	0 Tage	Die 04.07.23	Die 04.07.23
8	Personenführung	2 Tage	Mit 05.07.23	Don 06.07.23
9	Provisorien Betrieb	2 Tage	Mit 05.07.23	Don 06.07.23
10	Bauprovisorien + Brandfall	2 Tage	Mit 05.07.23	Don 06.07.23
11	Notfallplan / Beschriftungen	2 Tage	Fre 07.07.23	Mon 10.07.23
12	**Ausführung Sommerferien 2022**	**25 Tage**	**Mon 10.07.23**	**Fre 11.08.23**
13	Start Bauarbeiten	0 Tage	Mon 10.07.23	Mon 10.07.23
14	Vorbereitung Pers.führung	1 Tag	Die 11.07.23	Die 11.07.23
15	Installationen	2 Tage	Don 13.07.23	Fre 14.07.23
16	Abbrüche	4 Tage	Sam 15.07.23	Mit 19.07.23
17	Rohbau 1 + 2	5 Tage	Die 18.07.23	Mon 24.07.23
18	Haustechnik	7 Tage	Don 20.07.23	Fre 28.07.23
19	Ausbau 1	7 Tage	Die 25.07.23	Mit 02.08.23
20	Ausbau 2	9 Tage	Die 01.08.23	Fre 11.08.23
21	Etappenabschluss	0 Tage	Fre 11.08.23	Fre 11.08.23
22	**Ausführung Herbstferien 2022**	**15 Tage**	**Mon 02.10.23**	**Fre 20.10.23**
23	Start Bauarbeiten	0 Tage	Mon 02.10.23	Mon 02.10.23
24	Absperrungen / Personenführung	1 Tag	Die 03.10.23	Die 03.10.23
25	Instalaltionen / Vorbereitung	2 Tage	Die 03.10.23	Mit 04.10.23
26	Rohbau 1 + 2	3 Tage	Mit 04.10.23	Fre 06.10.23
27	Elektroanlagen	4 Tage	Fre 06.10.23	Mit 11.10.23
28	lüftungsanlagen	5 Tage	Mon 09.10.23	Fre 13.10.23
29	Ausbau 1	4 Tage	Mit 11.10.23	Mon 16.10.23
30	Ausbau 2	8 Tage	Mit 11.10.23	Fre 20.10.23
31	Abschluss Bauarbeiten	0 Tage	Fre 20.10.23	Fre 20.10.23
